



231001061530




扫一扫查真伪

检测报告

Testing Report

No. 25010567



产品名称

PRODUCT NAME

CG 浮筑楼板保温隔声板保温隔声系统

工程名称

PROJECT NAME

广兴工业园办公楼（公司样板间）

委托单位

CLIENT

江苏臣功广兴节能科技有限公司

生产单位

PRODUCING UNIT

江苏臣功广兴节能科技有限公司

江苏建科鉴定咨询有限公司

Jiangsu JianKe Appraisal & Consultation Co., Ltd.



委托编号: 2531066

江苏建科鉴定咨询有限公司

检验检测专用章

检测报告

No. 25010567

签发日期: 2025 年 05 月 26 日

检测项目	房屋围护结构现场热工性能 (传热系数)		
产品名称	CG 浮筑楼板保温隔声板保温隔声系统		
工程名称	广兴工业园办公楼 (公司样板间)		
委托单位	江苏臣功广兴节能科技有限公司		
生产单位	江苏臣功广兴节能科技有限公司		
建设单位	/		
施工单位	/		
监理单位	/		
见证人	/	见证号	/
检验类别	现场检测	委托日期	2025. 03. 19
工程地址	江苏省镇江市句容市后白工业园区金前路 88 号	检测日期	2025. 03. 26-2025. 04. 02
工程概况	/		
检测依据	《民用建筑节能工程热工性能现场检测标准》DB32/T 4107-2021 《居住建筑浮筑楼板保温隔声工程技术规程》DB32/T 3921-2020		
检测结果	经检测, 本次所测公司样板间 CG 浮筑楼板保温隔声板保温隔声系统传热系数值为 $1.34\text{W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 。		

批准:

审核:

检测:


检 测 结 果 汇 总


序号	检测部位	检测项目	单位	技术要求	检测结果	结果判定
1	办公楼 302 室 与 202 室之间 分户楼板	传热系数	W/(m²·K)	符合设计要求	1.34	/
说明	1、委托方提供的楼板系统构造（自下而上）：120mm 现浇楼板（四周铺竖向隔声片）+20mmCG 浮筑楼板保温隔声板（II 型石墨 EPS）+40mm 细石混凝土（内含钢丝网片）。 2、项目位于江苏省镇江市句容市后白工业园区金前路 88 号，办公楼 302 室与 202 室之间分户楼板。					

检 测 用 主 要 仪 器 设 备 一 览 表

序号	名 称	规格型号	编 号	检定有效期
1	建筑热工温度热流巡回检测仪	SDR-32	JK15319	2025-06-06

分户楼板上下面各测点测试结果如下列各图所示：

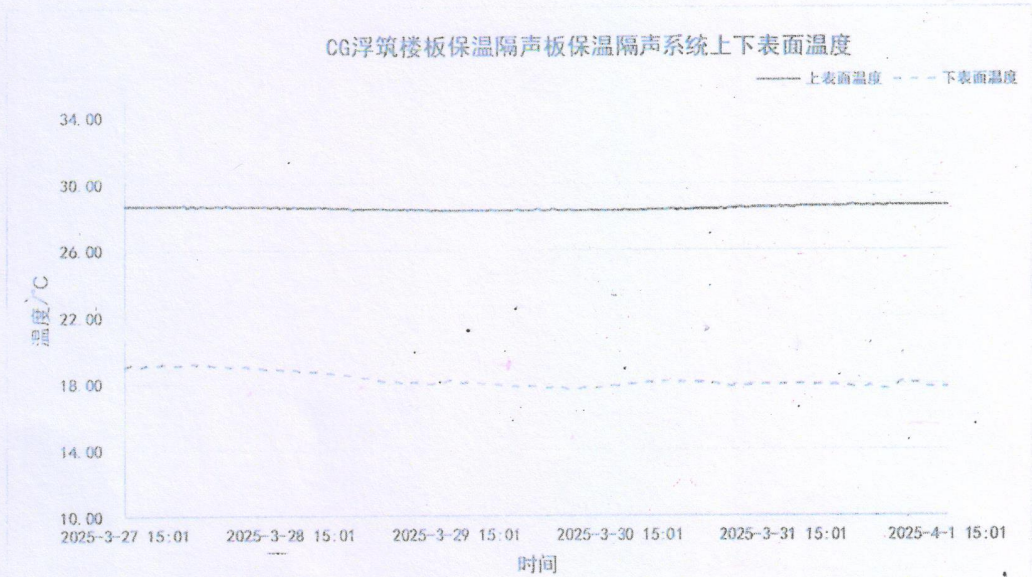

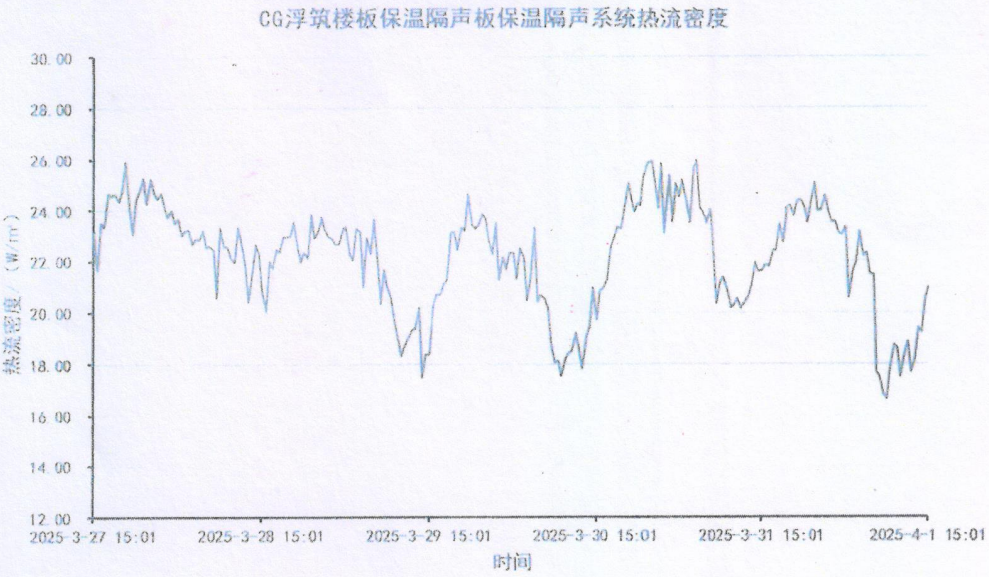

本页以下空白

出算
